

管理番号

K40241

動作確認チェックシート
(リフロー炉)

《 温度範囲 》

下部ヒーター設定～350℃

検査日	2025年2月10日	電源電圧	3相200V15KVA	コンベア速度	0.1～0.5m/min
型式	UNI-5016F	周波数	50/60Hz	流れ方向	左から右
メーカー名	アントム(株)	コンベア H=900mm	メッシュ 幅160mm	ヒーター	5ゾーン
機械Ser.No	112803	部品高さ	上面 15mm	概寸WxDxH	159x79x149cm
製造年月	不明(推定2011年頃)				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。	○
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7 付加機能	過昇防止器・ファン・圧力計・ダンパー・記録装置・パトライト等は正常か。	○
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

最高・最低温度到達時間

21℃→260℃

準備完了まで約36分

備 考 (動作確認追記事項・不具合内容等)


注1. パスワード「4321」。稼働時間「2903h」

条 件: Ta≒19℃、無負荷、Vin≒210V



運転画面の一例

温度プロファイル

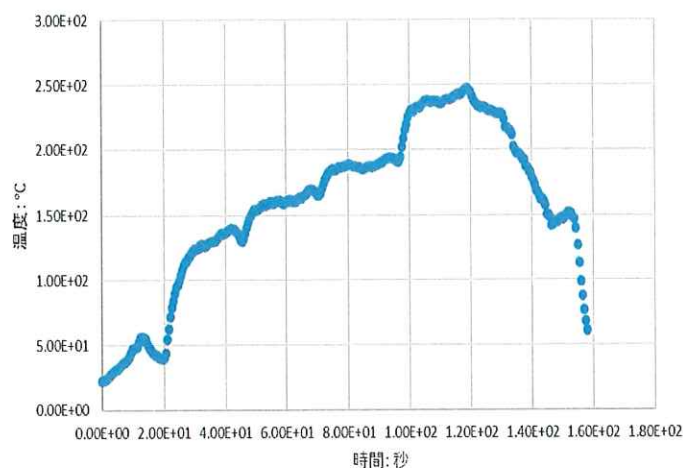

温度プロファイルの一例

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

2025年4月22日 再検査 20→260℃ 35min. コンベア動作他問題なし

野次



年月日	修理・改造記録	作業者

入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[12.0 H] 260℃設定での運転は確認済み
検査担当者[小林 隆志]
ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

中野

ASK INDEX
