
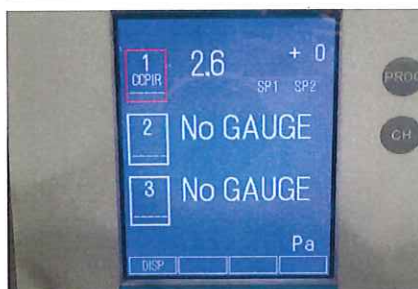


## 動作確認チェックシート

|          |             |                  |          |      |            |
|----------|-------------|------------------|----------|------|------------|
| 検査日      | 2024年11月27日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |          |      |            |
| 商品名      | ドライ真空ポンプ    | 電源・電圧            | 三相 200V  | 冷却法  | 水冷         |
| 型式       | MU100XU-122 | 周波数              | 50・60 Hz | 定格電流 | 11.6 A     |
| メーカー名    | 桧山          | 吸気口              | KF50     | 排気速度 | 1660 L/min |
| 機械Ser.No | 134DN62969  | 排気口              | KF25     | 重量   | 60 kg      |
| 製造年月     | 2013        | 規格値(到達圧力)        | 1.5 pa   |      |            |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る。                           | ○        |
| 6 到達確認    | 機器仕様/規格値を満たしているか。                      | ○        |

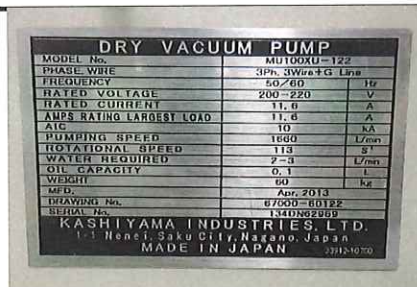

到達圧力 : 2.6 Pa



N2.流量0到達圧力:1.6 Pa

※検査時、到達圧力を測定するため電源ケーブル・水カプラ・吸気フランジを取り付けております。

取扱説明書( 無 ) 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.0H]

検査担当者[金子]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

