

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月8日	電源電圧	AC100~115V		
商品名	スピードコントローラ		AC200~230V		
型式	DSC-MU		DC24V(制御用)		
メーカー名	オリエンタルモータ	周波数	50/60Hz		
機械Ser.No	-	外寸(mm)	W35×D87×H105		
製造年月	2021年製				

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未対象・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等)

製品の構成:①モーター②スピードコントローラ

※動作には適合モーターが必要となる為、通電確認のみ実施


- 1 外観確認:正常、コントローラ本体に傷や破損等の異常なし
- 2 通電確認:正常、通電時の異常発生なし
 - ・AC100V通電時POWER LED(緑)点灯確認
 - ・DC24V通電時、表示部点灯確認(※写真表示「AL26」→モーターケーブル断線アラーム)
 - ・DC24V通電時、ALARM LED(赤)点灯確認



本体正面



AC100V通電時

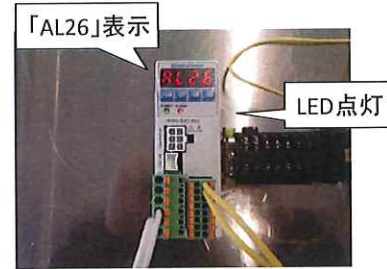

DC24V通電時

取扱説明書(無)※インターネットから入手可能

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0 H]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日
