

管理番号

080333

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|----------------|--|--|
| 検査日 | 2025年3月21日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | FFU | 電源電圧 | 単相AC100V~240V | | |
| 型式 | SS-MAC-35 | | DC/24V | | |
| メーカー名 | 日本エアータック | 周波数 | 50/60Hz | | |
| 機械Lot,No | 100-001955-111067 | 最大吹出風速 | 0.52m/s | | |
| 製造年月 | - | 外寸(mm) | W410×D410×H150 | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) 測定値 |
|-------------|---|-----------------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 フィルター確認 | 汚れ・破れ・破損等はないか。 | ○ |
| 6 パーティクル測定 | 社内用器具でパーティクル測定を3回実施する。(測定Size:0.3μm) | ○ |
| 7 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |
| 8 データバックアップ | PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未対象・未) | |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


1. 動作確認結果: 正常、上記チェック項目1~6を満たす事を確認済
2. 風量・SW確認: 問題なし
3. LED: 問題なし




FFU本体



測定環境



測定結果

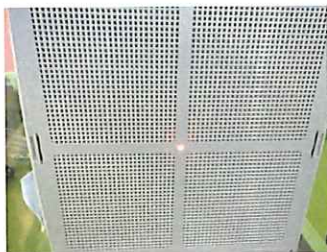

吹出風速測定

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数 [0.5h]

検査担当者[三科]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

