

動作確認チェックシート

検査日	2025年8月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボ分子ポンプ(セット)	電源電圧	AC100/200V	質量	約11kg
型式	ターボ本体: TG203VW コントローラ: TG203	周波数	50/60Hz		
メーカー名	大阪真空	吸気口フランジ	VG100		
機械Lot.No	ターボ本体: 2241 コントローラ: AK111021-5	排気口径	NW25		
製造年月	ターボ本体: 2000年2月 コントローラ: 2011年11月	冷却方式	水冷		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未 対象 ・NG) TP (済・未 対象 ・NG) BT交換 (済・未 対象 ・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1, 外観確認: 正常、著しい傷や破損等の異常無し
- 2, 電源投入確認: 正常、100V電源使用、弊社ドライポンプ使用、電源投入時異常発生無し、「Standby」表示確認済
運転時間表示: 46899h
- 3, 起動確認: 正常、「LOCAL」モードで「START」→「Acceleration」表示及び回転上昇確認済
「START」→「Normal」約5分、Normal回転数: 48000rpm
約1時間運転動作確認し異常無し、真空到達度: 2.57×10^{-3} Pa
- 4, 停止確認: 正常、「STOP」ボタン→「Brake」表示確認済、停止時間約7分、回転数表示減少確認済
停止後「Standby」表示及び0rpm確認済
- 5, 付属品: 電源ケーブル(コネクタ入力側カット品)、モータケーブル(コントローラ〜ターボ間)、リモートコネクタ



ターボポンプ吸気口



ターボポンプ動作環境

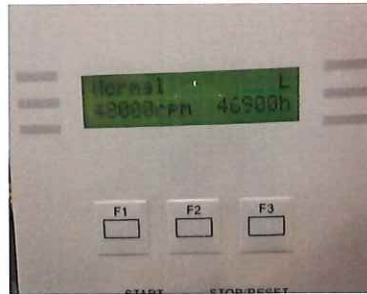

定常回転時

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [4.0h]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

