



動作確認チェックシート (精密空調ユニット)

検査日	2023年 11月 20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
型式	TCE-20WTNC-Z	電源電圧	3相200V	吹き出し口寸法	φ 200mmx2口
メーカー名	日本スピンドル	消費電力	2.5/3.3KVA	キャスター含む 外寸法(WxDxH)	90x80x170cm
機械Ser.No	TC-06I048	温度制御範囲	注1. 20~26°C	冷凍機	(空冷・ <u>水冷</u>)
製造年月	不明(推定2006年頃)	湿度制御範囲	不可	冷媒	R-407C 6.0Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。	○
5 湿度調節機能	使用湿度範囲の調節ができるか。	—
6 付加機能	<u>安全装置(ELB)</u> ・ <u>(ファ)</u> ・ <u>給排水装置</u> ・記録装置・警報器等は正常か。	○
7 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
8 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

注1. 周囲温度に対し-5~+2°Cの範囲で設定する制約あり(後継機TCE202ATAから推定)。今回の動作試験では、周囲温度が17°Cだったため制約条件を守れないが、やむを得ず設定温度20°Cにて実施した。

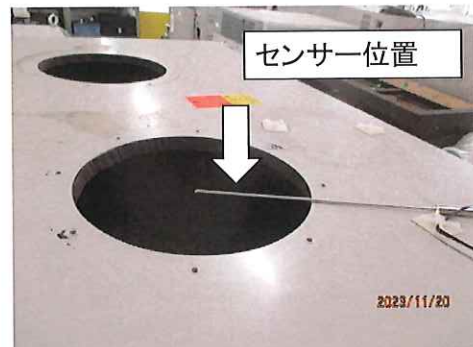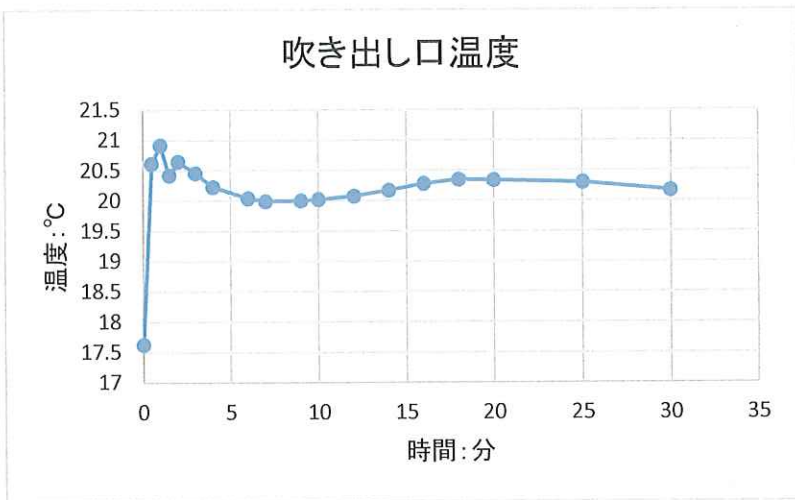

注2. エマージェンシースイッチ動作 ○. K(表示は消灯するがELBは落ちない)

取扱説明書(なし)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI-入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK・NG)

作業工数[7.0 H]

○. K

検査担当者[小林 隆志]



ユーザー名【

】出荷日

年

月

日
