


## 動作確認チェックシート

検査日	2016年 12月 13日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	熱風乾燥機	電源電圧	単相 AC200v 30A
		ヒーター	1330w × 3
		ブロワー	0.4kw
		装置外寸	750 × 1060 × 1360
		装置内寸	590 × 460 × 200

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、温度変更確認済み。
- 2 タイマー停止問題なし。70℃/1hの連続運転確認済み。
- 3 フィルム等、送り機構有り(幅300mm)、送風口上下に有り(ダンパー付き)

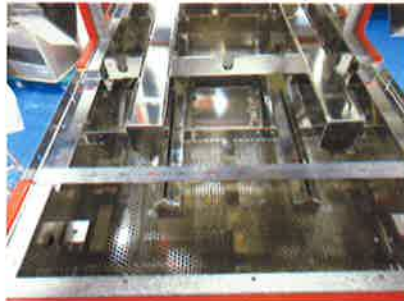

操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2016 12 12	電気系統改造	横内

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 15 H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

