


動作確認チェックシート

検査日	2021年7月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ペローズポンプ	外形	284X142X147	エア-接続口径	Rc1/4
型式	PE-10MA	最大吐出量	16L/min	エア-圧力	0.2~0.5MPa
メーカー名	日本ピラー工業	空気消費量	30~340 L/min	重量	約8kg
機械Ser.No	—————	ポンプ接続口	IN φ12		
製造年月	—————	"	OUT φ12		
		ス110-30003ポンプ用電源ケーブル			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4		—
5 消費電流	クランプで実測。	—
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ポンプ近接SW無し、穴を封止、エアを電磁弁に供給、SWで切替、給水、排水問題なし。

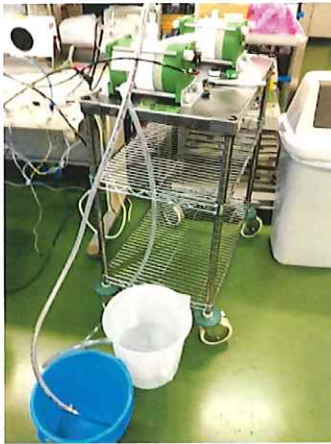

取扱説明書(無)

ナット無し



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2024.5.21	出荷前再動作実施。 → 動作問題なし。 (近接SW用穴はメクラ処置済)	小林(亮)

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

