

管理番号

GA0499

動作確認チェックシート


検査日	2023年6月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ベローズポンプ	Air圧	0.2~0.5MPa		
型式	A-50-PB	吐出量	6.4L/min		
メーカー名	大和電機製作所				
機械Ser,No	A0603024				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 エアーコンプレッサーに接続、水をINからOUTへ排出。

水INからOUTへ排出。

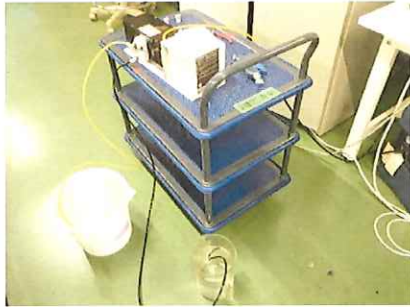

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

