


管理番号

H40458


動作確認チェックシート


検査日	2024年2月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラムポンプ	電源・電圧	単相 100V	冷却法	電動ファン
型式	DA-60S	周波数	50・60 Hz	電流値	5.6/5.0A
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	O.DΦ9×I.DΦ5		
機械Ser.No	93963	排気フランジ	O.DΦ9×I.DΦ5		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	21.3×10 ³ Pa (-80KPa)		


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力：-80.0KPa

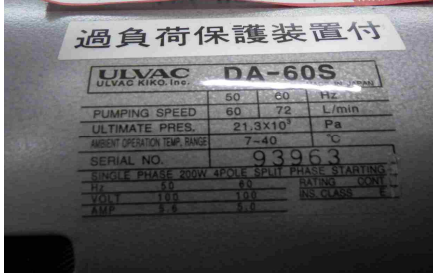






電流値：3.85A

取扱説明書(無) * 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年2月5日	内部クリーニング、バルブ調整	金子

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業時間[3.5H]		
検査担当者[金子]		
ユーザー名【	】出荷日	年 月 日
