

管理番号





H80246

動作確認チェックシート

検査日	2024年 4月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	スパッタ装置	電源	AC200v 100A
型式	L-430S-FHL	設置サイズ	4000x2000x2000
メーカー	アネルバ	成膜保障範囲	φ210

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。
 装置立ち上げ、ロータリポンプ、クライオポンプ、ターボポンプ共に動作問題なし。
 DC/RF共に放電確認、ガス流量調整、スパッタ電力変更OK。(3箇所共)
 基板搬送、シャッター等動作問題なし。

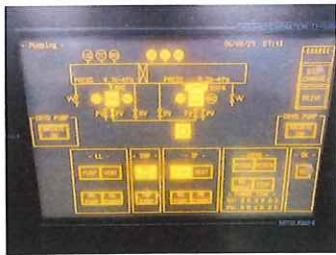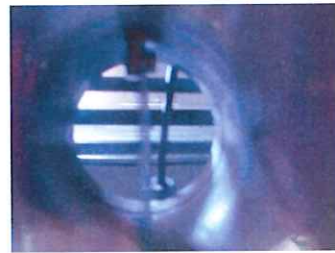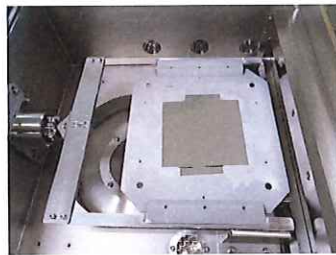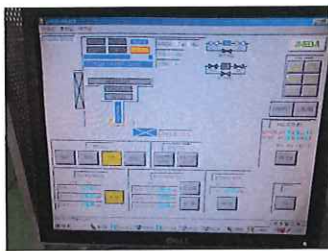

操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[50H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

