

動作確認チェックシート
(インキュベーター)

検査日		2023年 07月 25日		温度範囲	
型式		FI-280		R.T+5℃~45℃	
メーカー名		アズワン		電源電圧	
機械Ser.No		1909		単相100V 60W	
製造年月		2019年 09月		内寸法(W×D×H)	
				329x219x369mm	
				外寸法(W×D×H)	
				420x413x485mm	
				周波数	
				(50)・(60) Hz	
				加熱器	
				ヒーター	
				送風ファン	
				(有)・(無)	
				ダンパー機構	
				なし	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。	—
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	/
7 付加機能	過昇防止器・ファン・差圧計・ダンパー・記録装置・パトライト等は正常か。	
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

最高・最低温度到達時間

20℃→ 45℃

約 35分

℃→ ℃

約 分

条件: Ta≒22℃ Vin≒105V


備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

注1. 天井部にほとんど目立たないへこみキズあり。

注2. 45℃設定での運転時オーバーシュート2℃あり。



45℃設定の運転

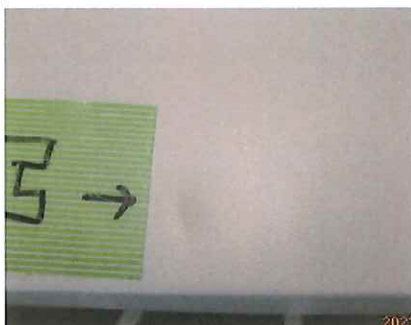

キズの写真

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025.3.25.	再動作確認	上田 (早川)

File Maker入力

動作(OK・NG)

作業工数[4.5 H]

(備考欄コメント)

45℃ O. K

[責任者]

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

