

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年6月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	AC100V	
型式	DA-241S	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アルバック	排気速度	240/260L/min(50/60HZ)	
機械Ser.No	01269	到達圧力	16KPa	
製造年月		ゲージ圧表示	(-85.3KPa)	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスト・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 弊社真空度計で-88.7KPa到達を確認、1h連続運転。
- DA-121Dフランジに交換されている。
- DA-121D仕様

排気速度 120/145/min  
到達圧力 16000Pa(-98KPa)

改造表示

フランジDA-121D用

-88.7Pa確認

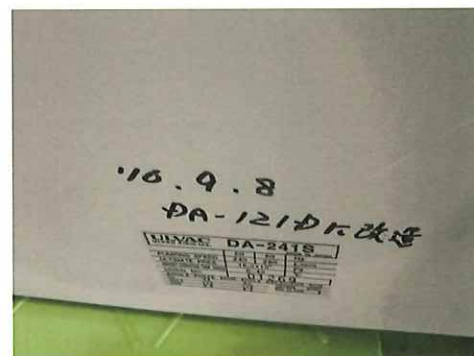

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File-Maker入力 SHIRASAGI  
動作(OK) 作業工数[ 1.5H]  
検査担当者[ 上田 ]  
ユーザー名[ ]

(備考欄コメント)

[責任者]

出荷日 年 月 日

