

K50168

動作確認チェックシート

検査日	2024年 12月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオナイザー電源	電源電圧	AC85~135V 0.31A	出力電圧	DC28V 1.3A
製造年月	不明	電源周波数	50/60Hz兼用	型式	モデル470
メーカー名	ヒューグルエレクトロニクス	質量	約940g	モデル453 除電バー対応	
寸法(全長)	W156×D190×H95mm	シリアルNo.	0011126	取付け金具・ACコード付	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


1、外観・クリーニング実施。→特に問題なし。

2、除電確認実施。→除電バーとの動作OK。(社内計測器NK-7001により除電確認。及び、イオンバランス確認。)

(除電確認:中央と両端中央より±800mm付近、除電距離500mm付近での測定を確認。)

(コントローラーのPULSED-DC切替スイッチ動作確認とPULSE RATEボリューム動作確認。)

(除電バー出力CH1~CH3の出力確認。)

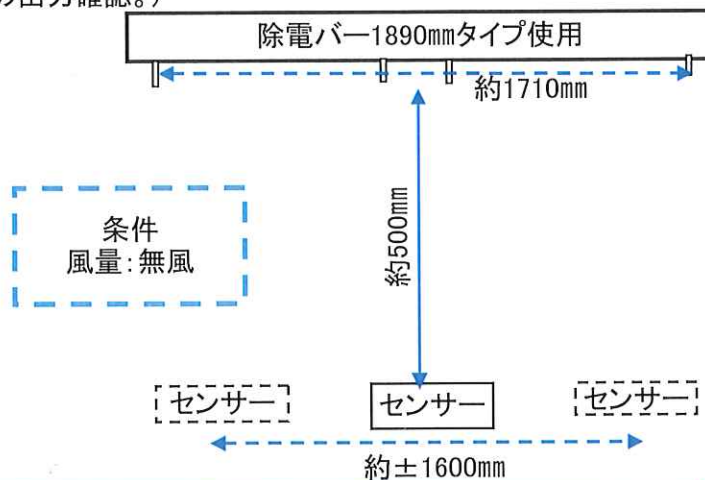

イオンバランス 約最大+500V、-600V付近を確認

除電時間	+1000V→+100V	約1.58秒	約0.82秒	約1.18秒
参考値	-1000V→-100V	約1.81秒	約1.38秒	約1.90秒

除電時間:約±1000V→±100Vになるまでの減衰時間(目安時間)
気温20℃ 湿度約30%条件

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作(OK) 作業工数[2.0 H]
検査担当者[小林(克)]
ユーザー名【

(備考欄コメント)

[責任者]



】出荷日 年 月 日
