


K60503

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	三相 200V	積算時間	20854 h
型式	A10S	周波数	60/50 Hz	定格電流	11.1/11.7 A
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW40	最大排気速度	1200/1000L/min
機械Ser.No	A80212	排気フランジ	NW40	重量	220 kg
製造年月	-	規格値(到達圧力)	4.0/5.3 Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常かな。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

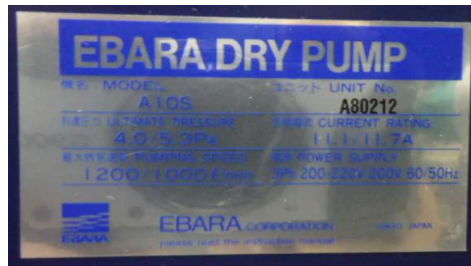

到達圧力: 2.8Pa

電流値: 7.5 A

ケーシング温度: 101℃

取扱説明書(無) * 暖気運転1時間30分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

検査担当者[金子]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

