

管理番号

L20151

動作確認チェックシート

検査日	2025年2月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU	電源電圧	AC100V		
型式	MAC-11FR	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日本エアテック	外寸(mm)	W250×D250×H145		
機械Lot, No	A15907015	風量	1.0m ³ /min		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×) 測定値
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○ ※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 フィルター確認	汚れ・破れ・破損等はないか。	○
6 パーティクル測定	社内用治具でパーティクル測定を3回実施する。(測定Size: 0.3 μm)	平均値: 0個
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
8 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未対象・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認: 正常 ※1 ①FFU上面2ヶ所に筐体部割れを確認 ②FFU設置面全体に傷有り→①②ともにFFU性能に影響無し
2. 動作確認結果: 正常、上記チェック項目2～6を満たす事を確認済
3. 風量切換SW確認: 正常、高速/低速の風量切替わりを確認済
4. 付属品: 電源ケーブル(着脱式)




FFU本体




測定環境



測定結果

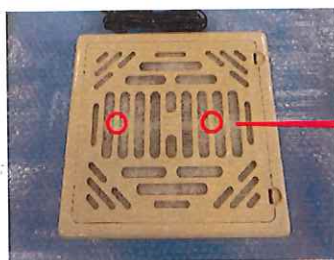

FFU上面筐体部割れ

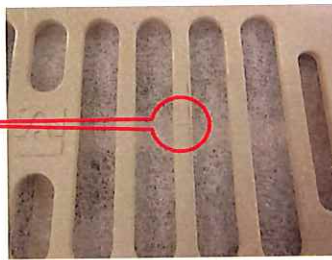

FFU上面筐体部割れ拡大



FFU設置面傷

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [0.5h]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

