

動作確認チェックシート

検査日	2021年9月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	バイオクリーンベンチ	電源電圧	AC100V 475W	寸法wxdxh	1350x791x2140
型式	MHE-130AJ	周波数	(50 / 60)Hz	ワークエリア	1200x601x680
メーカー名	三洋電機	集塵効率	99.99%(0.3 μm)	照明(蛍光管)	40Wx2(グロー)
機械Ser.No	010068	循環気率	約70%	殺菌灯	15Wx2(グロー)
製造年月		排気量	7.92m ³	重量	315W

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 弊社パーティクルカウンターで1分5回測定0.3 μm、0.5 μm共に0個であった、フットSW、蛍光管殺菌灯、操作、各アラーム問題無し、

作業台にパーティクルカウンター




取扱説明書(有)

コントロール部



排気センサー

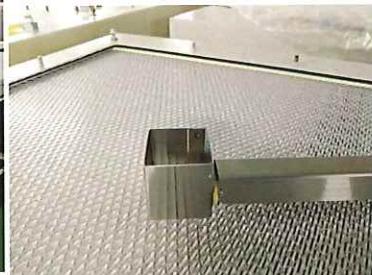

ガス電磁弁、真空ポンプ、フットSW取り付け部(フットSW、1個付属)



排気フィルターガード



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

