

L50297

動作確認チェックシート

検査日	2022年 11月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マイクロフォーカスX線検査装置	電源電圧	単相200V, 16A	最大サンプル高さ・重量	210mm, 5kg
型式	XD7600NT	周波数	50/60Hz	傾斜角度	0~70°
メーカー名	Nordson DAGE	大きさ(W×D×H)	1450×1700×1970mm	付属品 (オプション)	3次元CTユニット
機械Ser.No	X217511	モニタ倍率	最大7800倍		CT解析用PC
製造年月	2011年12月	最大検査エリア	458×407mm		リフローシミュレータ

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置立上げ、イニシャライズ問題なし。
- 2 サンプルアクセスドアの開閉操作問題なし。
- 3 カメラの傾斜操作問題なし。
- 4 X線管のウォームアップ開始後に、『Penning fault』のエラー発生。
X線管は交換が必要。
以上の確認までを実施。(1,2,3項は動画撮影を実施)



2025年6月25日 再チェック
1. 装置立上げ、イニシャライズ問題なし。
2. X線管ウォームアップ時『Penning fault』エラー発生。
前回と同現象

野沢

取扱説明書(有)

エラー画面

エラー内容
An error has been reported by the tube.

エラー原因
Penning fault

対応
XHowText

ユーザー DAGE

日時 2022/11/08 15:55:39

OK

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)


[責任者]

動作(保留) 作業工数[15H]
検査担当者[野沢]

X線管の交換が必要。

野沢

イニシャライズ

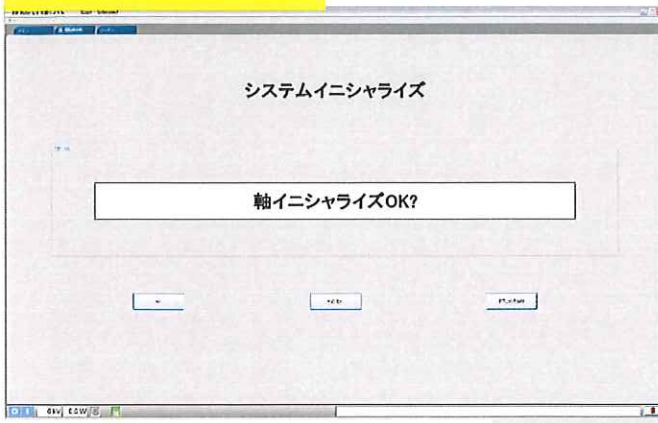


システムイニシャライズ

全軸イニシャライズ中...

ズ

イニシャライズ終了後画面

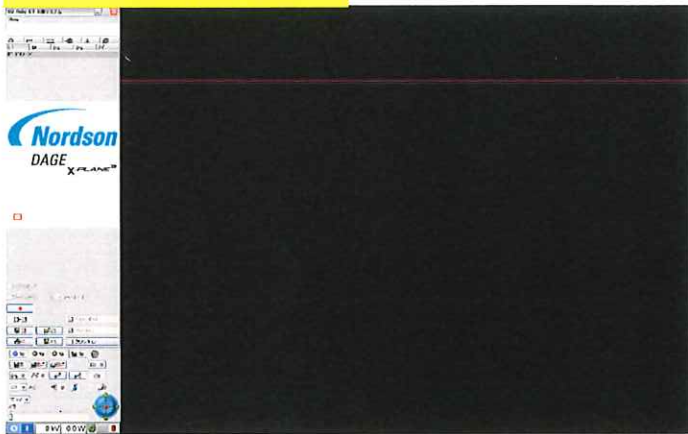

イニシャライズ完了

イニシャライズ完了時



サンプルアクセスドア開時

