

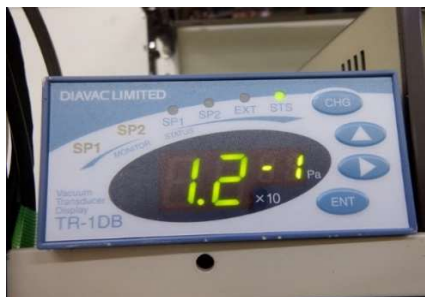
動作確認チェックシート

検査日	2025年2月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	V060HA	周波数	50・60 Hz	排気速度(50/60Hz)	900・1000L/min
メーカー名	アネルバ	吸気フランジ	NW40	モーター出力	2.2KW
機械Ser.No	075DN5835	排気フランジ	NW40	電流値	8.5A
製造年月	—	規格値(到達圧力)	6.0×10^{-1} Pa	重量	77Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



・コントローラーは検査用の為、付属致しません。

到達圧力: 1.2×10^{-1} Pa

電流値: 6.3A

・暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。(測定圧力は規格値を満たしております。)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

