

LB0681




動作確認チェックシート

検査日	2024年8月1日				
商品名	CNC画像処理システム (QUICK VISION APEX)	電圧	AC100-240V 1.7kW	最大積載重量	50kg
型式	QV-X606P1L-D	周波数	50/60Hz	照明	白色LED
メーカー名	Mitutoyo	測定範囲	600x650x250 ^{mm}	対物レンズ	QV-objective HR 1x/0.084 2.5x/0.21
Serial No	41756054	載物ガラスの大きさ	697x758mm	全長(LxDxH)	1985x1309x1570 ^{mm}
製造年月	2017年	スケール分解能	0.1 μ m	本体質量	1330kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 PC起動⇒問題なし。
- 2 計測ソフト立上げ⇒問題なし。(Pass Wordなし)
- 3 駆動系確認⇒問題なし。(X,Y,ZInitialize)
- 4 テンプレートにて測定⇒問題なし。

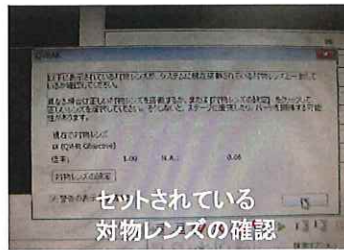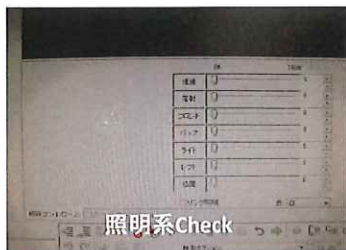

取扱説明書: 有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.5 hr]

検査担当者[雨宮]

・※OS:Windows7 Pass Word:なし



【付属テンプレートにて測定】

