

動作確認チェックシート

検査日	2022年9月2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	卓上型プッシュプル換気装置	電源電圧	AC100V	プッシュ側風速	約0.4m/s
型式	ラミナーテーブルHD-51b	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	1020x750x1065
メーカー名	興研	定格消費電力	235/300W		
機械Ser.No	15G144	照明	20W型LED		
製造年月		処理風量	約7m ³ /min(プル側)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

本機はホルムアルデヒド等の有毒ガス除去する装置、粉塵は対応外、フィルター状態は不明、ファン異音なし、照明点灯、各SW問題無し、積算時間リセット可、プッシュ側風速0.4m/s以上確認。

照明



SW、積算時間

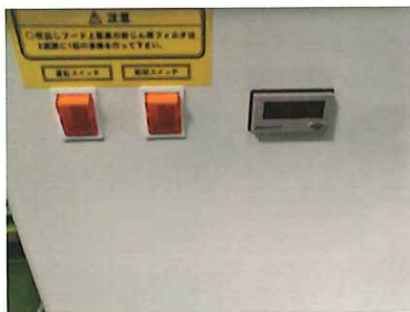

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025-11-5	再動作確認	上田

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

