


動作確認チェックシート

検査日	2023年2月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアークンプレッサー	電源電圧	AC100V	外寸	φ450x560
型式	VC-4R	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	ホーミ八重崎空圧	タンク	12L		
機械Ser.No	11-002	流量	19/22.4L/min		
製造年月		圧力	0.5~0.65MPa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 SW,ON、0.65MPa以上で停止、0.5MPa以上で再起動(付属圧力計)。

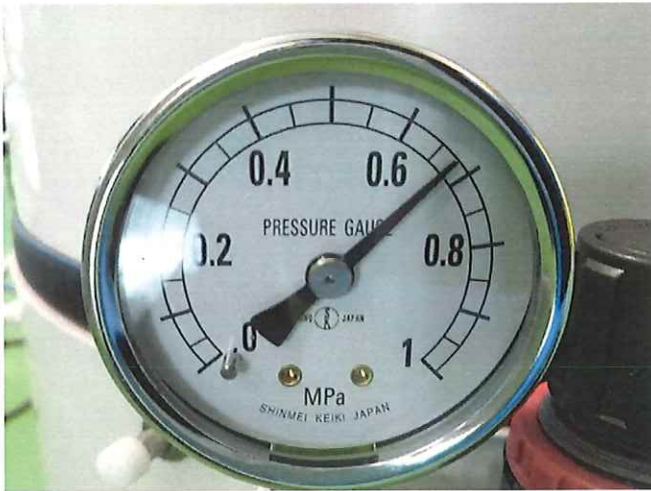

0.65MPa以上

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

