

動作確認チェックシート

| | | | | |
|----------|------------|------------------|--------|--|
| 検査日 | 2022年11月8日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | |
| 商品名 | 成型真空デシケーター | 内寸 | φ305mm | |
| 型式 | RVD-300 | 全容量 | 約13L | |
| メーカー名 | アズワン | 減圧許容度 | 133Pa | |
| 機械Ser.No | | | | |
| 製造年月 | | | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|---------|---------------------------------|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | △ |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 下表示まで減圧、2h後変化なし、押さえプレート固定部一部欠損、使用上問題無く減圧可。
使用真空ポンプ、アルバックDA-121D(ダイヤフラム)



取扱説明書(無)

付属品

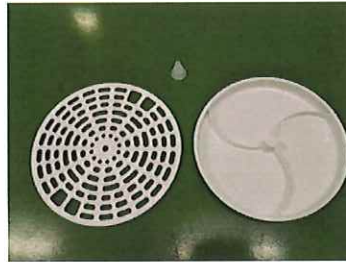

押さえプレート固定部一部欠損



修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録・再動作 | 作業者 |
|-----|-------------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

