

動作確認チェックシート

検査日	2022年 11月 1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	X-Yテーブル	電源	AC100V	X軸	VS1-200A
型式	_____		50/60Hz		移動量200mm以上
メーカー名	ニコン	ステージコントローラ	9VAJ1	Y軸	VS1-100A
ステージコントローラSer.No	346230	表示器	SC-102		移動量約77mm
テーブル面サイズ	290×180mm	テーブル本体重量	約35kg	その他	付属品有



チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。システム運転が可能か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観構成確認。→問題なし。
 - 2、可動部確認実施。→Y軸モータに異音があった為、リニアスケールユニット再取付調整後、異音は問題なし。
→XY軸制御がスムーズに移動制御可能確認出来ました。尚、待機中は、モータ励磁制御音が
かすかにしますが、問題ありません。
- ★Y軸は手前から前後し、電気的リミットで停止しますが、X軸の左右の場合、右側が電気リミットが無い為
ステージ移動可能表示矢印マーク内(0-200)で使用願います。



動作確認

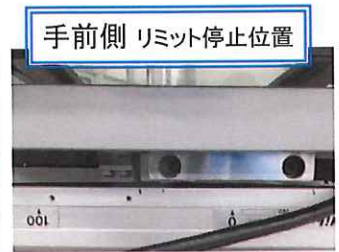

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[2H]
 検査担当者[小林(克)]
 ユーザー名[]

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

