

動作確認チェックシート (純水製造装置)

検査日	2023年3月23日				
型式	PRO-0500-001	電源電圧	AC100V	処理水量	500L/h
メーカー名	オルガノ	周波数	50/60Hz		
機械Ser.No	23193304	処理水水質	1 μ S/cm以下		
製造年月	-	純水タンク	100L		
外寸	W700 D750 H140				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・継手・スイッチ・計器等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は、正常か。	○
4 保管・出荷準備	ドレン抜き・ビス締め・清掃・グリスアップ・入庫元に関するシール等を取り除	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 動作確認実施。一連の動作問題なし。

採水水質 0.1 μ S/cm

2. 送水ポンプが付いています。動作確認 OK 起動スイッチは、付いていません。別途取付必要。

3. フィルター、ポンプ運転時間 約5Hrと表示 (写真参照)



採水 水質0.1 μ s/cm



純水タンク量:満水に近い

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]


動作[OK] 作業工数[2.0 H]

中野

検査担当者[中野]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

ASK INDEX

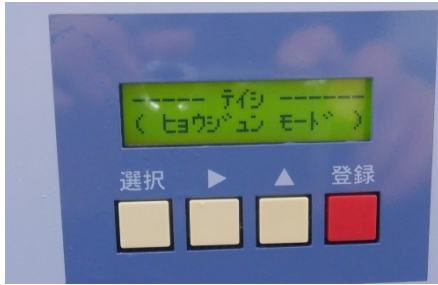

電源投入時表示



フィルター通水時間約5Hr



ポンプ運転時間 約5Hr



ROフラッシング時間設定1分(経過38sec)




水質表示:RO水質2 μ S/cm カートリッジ純水器出口0.1 μ S/cm



採水中 給水圧力



採水中 濃縮水圧力

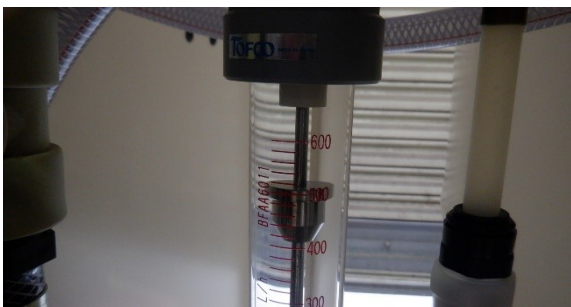

採水中 流量 500L



フラッシング時の流量 300L



フィルターが付属しています。使用されていない？
