


動作確認チェックシート

検査日	2024年4月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源	3相 380V	排気速度	7000L/min
型式	PKS-070	周波数	50HZ	モーター出力	11KW
メーカー名	アルバック	吸気口	VG100	重量	900Kg
機械Ser.No	A32A-03650	排気ミストラップ	TM-4		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	2.7 Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。/電源BOXに異常は無いか。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

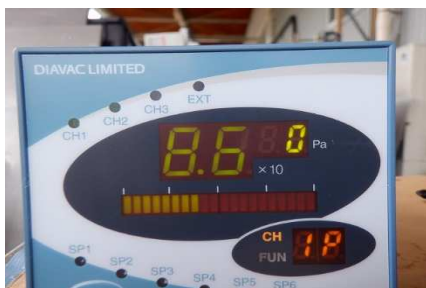

到達圧力 : 8.6Pa * ポンプ固定未実施の為、短時間の運転確認実施。

取扱説明書(無) * 異音/振動等は有りませんでした。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 到達圧力(OK) 作業時間 [3.0H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

