


管理番号

N30910

## 再動作確認チェックシート

検査日	2024年5月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	EV-S20P	周波数	50・60 Hz	排気速度	1670L/min
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW50	電流値	8.1A
機械Ser.No	DKA07771	排気フランジ	NW25	積算時間	1h
製造年月	2018年	到達圧力	5.0Pa	重量	60Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常かな。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器の仕様/規格を満たしているかな。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

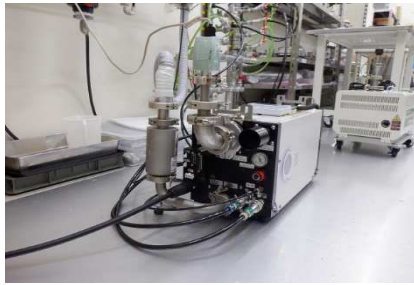

到達圧力：2.6Pa



MP電流値：2.26A



ポンプ温度：45℃

\* 暖気運転30分後、再起動時の到達圧力及び電流値です。到達圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	作業内容	作業者
2023年8月	オーバーホール実施	外注

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[ 責任者 ]

動作(OK) 作業時間[ 2.0H ]

検査担当者[ 立野 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

