


N30910

動作確認チェックシート

検査日	2023年8月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	EV-S20P	周波数	50・60 Hz	排気速度	1670L/min
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW50	電流値	8.1A
機械Ser.No	DKA07771	排気フランジ	NW25	積算時間	1h
製造年月	2018年	到達圧力	5.0Pa	重量	60Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いかな。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

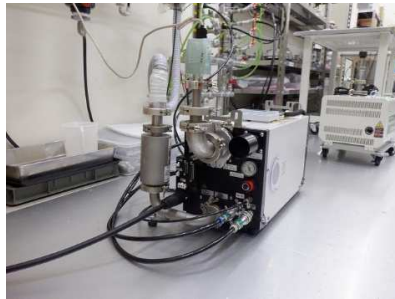

積算時間 : 1h



到達圧力 : 2.5Pa



MP電流値 : 2.24A



ポンプ温度 : 58°C

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力及び電流値です。 到達圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日		作業者
2023年8月	オーバーホール実施	外注

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【】出荷日 年 月 日

