

動作確認チェックシート




検査日	2023年10月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバーター	電源電圧	3相200V	適用モーター	5.5Kw
型式	FR-F820-5.5K-1	周波数	50/60Hz		
メーカー名	三菱電機	大きさ(WxDxH)	W150 D136 H260		
機械Ser,No					
製造年月	2017				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

パネルでの運転モードで確認 (モーター400wを駆動する)

30HZ,40Hz,50Hzで動作確認実施。

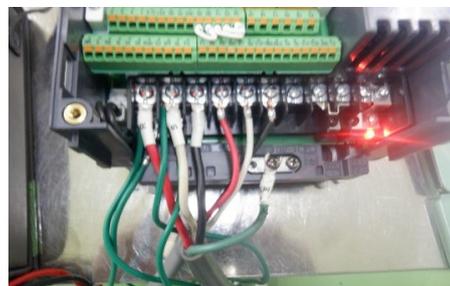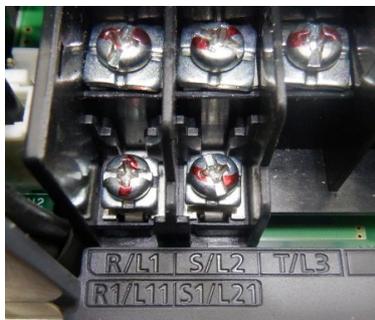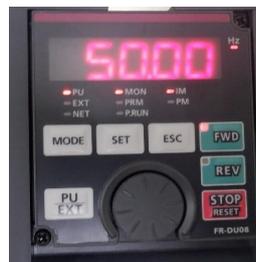

配線接続状態

取扱説明書(無) R/L1とR1/L11短絡 S/L2とS1/L21を短絡する事(本体で制御する場合)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.0H]

検査担当者 [中野]

中野

ユーザー名[]出荷日 年 月 日
