

管理番号

NA0426

動作確認チェックシート


検査日	2024年 6月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	手動フィルム貼付機	電源電圧	AC100V	ステージ寸法	150×250mm
型名	FDSG0101	周波数	50・60Hz兼用	試料厚さ	～最大約10mm
メーカー名	淀川メテック	本体Ser.No		ユーティリティ	真空源
外形寸法・重量	W467×D893×H400・25kg	製造年月	2013年		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。(クリーニング実施)
- 2、真空動作前の各部の機構部の動作確認。→問題なし。(上下左右の貼付位置の微調整はマイクロメータの調整による)
 - 2-1、上吸着部の回転はエア圧によるオープン側に回転するが、機能上手动操作の為、未使用。
- 3、社内真空ポンプによる貼付シーケンス手动動作確認。→動作問題なし。
 - 3-1、上吸着部:フットスイッチにより吸着・オープン時吸着大/オープンから貼付側にした時吸着小に切り替わる。
 - 3-2、下吸着部:手元手动スイッチで吸着。
 - 3-3、ローラー移動と押し圧は手动による。

動作確認

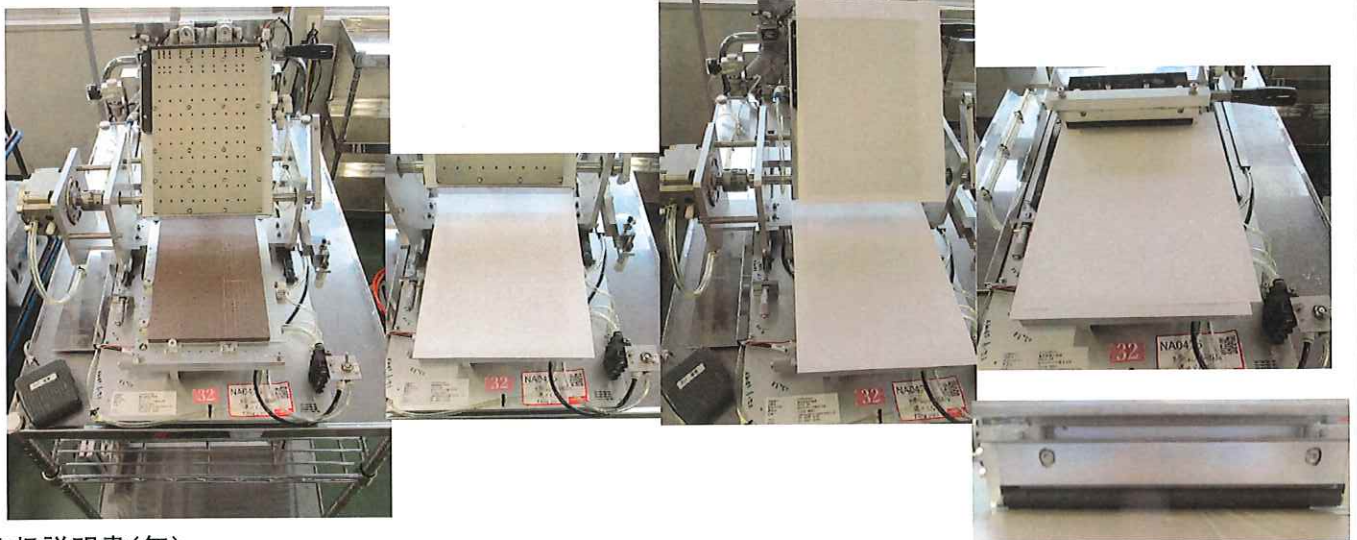

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
SHIRASAGI 入力 動作(OK) 作業工数[3H] 検査担当者[小林(克)] ユーザー名[]	(備考欄コメント)]出荷日 年 月 日	[責任者]
