


動作確認チェックシート

検査日	2024年7月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	単相AC100V	
型式	DA-120S	周波数	(50 /60)Hz	
メーカー名	アルバック	排気速度	120/144L/min(50/60HZ)	
機械Ser,No	99836	到達圧力	100Torr	(-88KPa)
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ダイヤフラム交換、真空計と接続、-80.5KPa確認、1h連続運転。

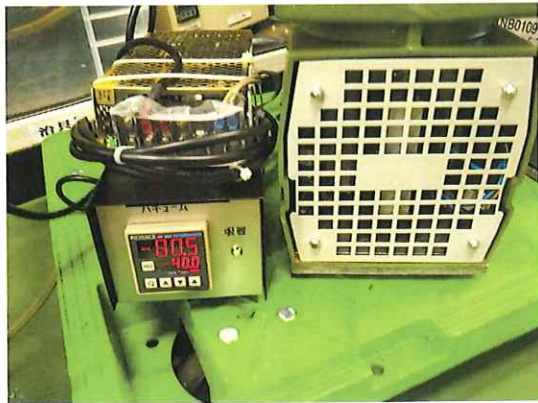

ケーブル短い30㊦位。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年7月1日	ダイヤフラム交換。	上田 穂刈

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

