

動作確認チェックシート


| | | | | |
|----------|------------|------------------|--------------|-------------|
| 検査日 | 2024年3月19日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | |
| 商品名 | ダイヤフラムポンプ | 電源電圧 | AC100V | |
| 型式 | DA-120D | 周波数 | (50 / 60)Hz | |
| メーカー名 | アルバック | 排気速度 | 120/145L/min | |
| 機械Ser.No | 74511 | 到達圧力 | 3.3KPa | (-97.98KPa) |
| 製造年月 | | | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |
| 6 | | |
| 7 | | |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 真空計と接続、-92.3KPa確認、1h連続運転。

真空計と接続。

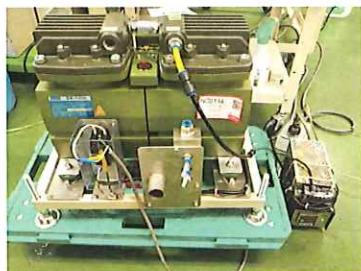

-92.3KPa



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録・再動作 | 作業者 |
|-----|-------------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

