

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源電圧	三相200～220V		
型式	SDE90U-058	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	樫山工業	到達圧力	1.3Pa		
機械Ser.No	05B3690	排気速度	1300L/min		
製造年月	2003	冷却水	4.8L/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 窒素代わりに、エアー導入、冷却水導入し起動、0.45Pa以下確認、1h連続運転。
- バックアップバッテリー注意表示点滅、取り敢えず使用可。

真空計と接続。



バックアップバッテリー注意点滅。

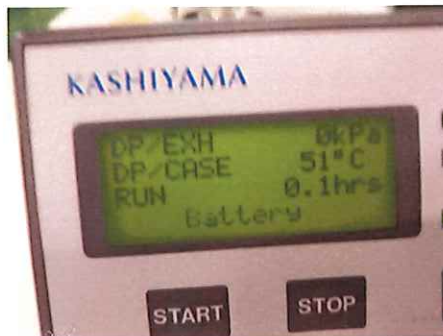

0.45Pa以下確認。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



