

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超音波洗浄装置	電源電圧	AC100V/200V	槽容量	63L
型式		周波数	50/60 Hz	ヒーター容量	1300W
メーカー名		蛍光灯	1灯	付属品	洗浄力ゴ
機械Ser.No		槽サイズ	W500D420H300	外寸	W800D850H2000
製造年月	年 月	超音波発振器	UltraSonicCleaner	重量	32Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△※1
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…異常なし



・発振器

社内測定器(ホンダ電子HUS-4)使用し超音波強度(mv)を測定
測定位置:BOX表面から20mm上げた位置にて測定
洗浄周波数:44kHz

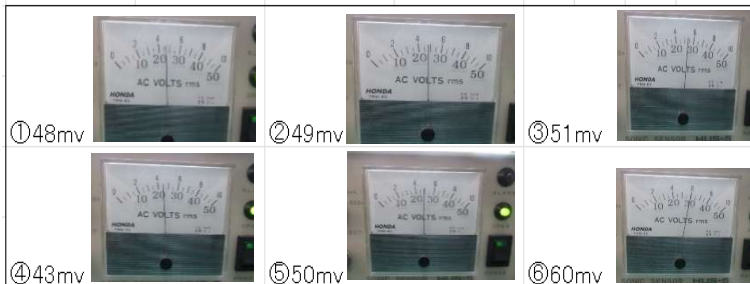

槽内(測定位置)

・通電確認

電源ON/OFF確認

表示部 確認

各スイッチ操作 確認



・照明

照明 点灯確認



・ヒーター機能(最高設定温度55℃)

表示器50℃まで確認 55℃表示確認出来ず
社内温度計で実温60℃まで確認



運転開始時



表示器50℃



実温60℃

※1 表示器温度と実温に約10℃の誤差有り

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(条件付きOK) 作業工数[H4]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

ヒーター表示器と実温誤差有り

出荷日 年 月 日

[責任者]

