

動作確認チェックシート

検査日	2025年10月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	集塵機	電源	φ3 200V 60Hz	基準風量	60m ³ /min
型式	SDC-L5500 BP	消費電力	5.5kW	吸引口内径	φ290mm(右側面)
メーカー名	スイデン	圧縮エア消費量	24L/M	排気口外径	φ398mm(上面)
Ser,No	AE03038	外寸法	W1200 D900 H1875		
製造年		重量	460kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観／雰囲気温度警報盤(熱電対で装置内部温度を測定)




■動作確認

手動運転で基準風量以上(60m³/min)の能力があるか確認する

計測器／風速計：KANOMAX 6035-00


風量計算値：21.1×0.145×0.145×3.14×60=83.6m³/min 風速(m/s) × ダクト断面積(m²) × 60(sec) = 風量(m³/min)

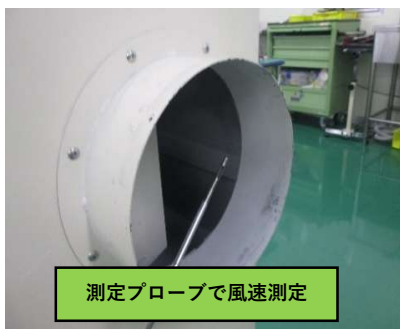

測定プローブで風速測定



風速測定値 21.1 m/s

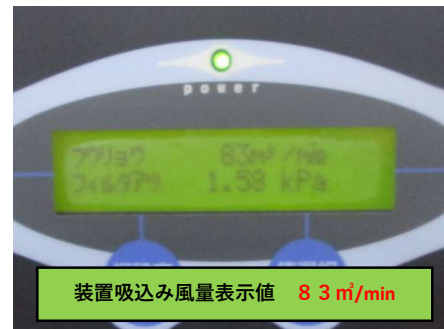

装置吸込み風量表示値 83 m³/min

取扱説明書(有／コピー)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[7H]

検査担当者[Usunabe]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

