


動作確認チェックシート

検査日	2024年 7月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	スパッタ装置	電源電圧	AC200v 50Hz 38A
型式	ISP-4000-HC	設置サイズ	2500x2000 リフター上昇高さ2750
メーカー	アルバック	ワークサイズ	φ 100
製造年	2005 9	ターゲット	φ 50.8x3
製造番号	MB04-1046-0	電源	RF200wx3 DC375w

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 到達圧力、-4Pa以下確認、ワーク搬送、シャッター等稼働部動作問題なし。
- 2 自動搬送して3元同時スパッタ、放電確認。レシピ変更等問題なし。

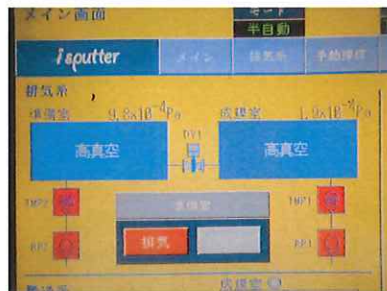

操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[30H]
 検査担当者[横内]
 ユーザー名 []

出荷日 年 月 日



アルバック スパッタ用ダミーターゲット 材質 アルミ 製作数 3

