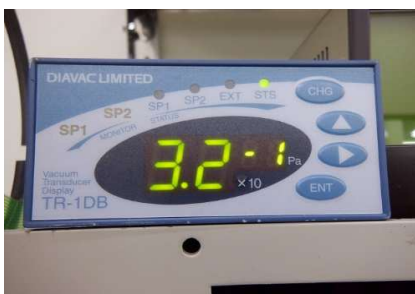


動作確認チェックシート

検査日	2024年10月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3P 200V	排気速度	240・290L/min
型式	D-240DK	周波数	50・60 Hz	使用オイル	R-7
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	NW25	外寸	500×231×251
機械Ser.No	A25A-01431	排気フランジ	G1(TMX-1付属)	重量	30kg
製造年月	—	規格値(到達圧力)	$6.7 \times 10^{-1} \text{Pa}$		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

到達圧力: $3.2 \times 10^{-1} \text{Pa}$

・電流値: 2.07A

取扱説明書(無)

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [3.0H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

