

090414

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	無停電電源装置(UPS)	定格入力電源	AC100～120V	バックアップ時間	10分(900W)
型式	BU150R	入力電圧範囲	AC70V±2V ～146V±2V		6分(1200W)
メーカー名	オムロン	周波数	50/60Hz±5.5Hz	充電時間	8時間
機械Ser.No	A3N18070006001G	最大電流	19.5A	バッテリー寿命	期待寿命:5年
製造年月	—	バッテリー	12V/7.2Ahx4個		


	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (済・ 未 対象・NG) TP (済・ 未 対象・NG) BT交換 (済・ 未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒問題なし。
2.電源投入⇒問題なし。
3.充電開始⇒問題なし。(8時間以上)



電源ON

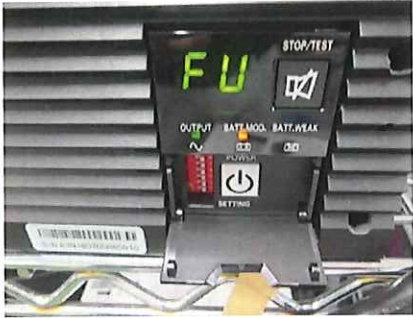

電源ON後テスト動作表示

異常なし

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数 [9.5 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

