

P10177

動作確認チェックシート


検査日	2025年5月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラムポンプ	電源電圧	単相AC100V		
型式	DA-60S	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アルバック	排気速度	60/72L/min(50/60HZ)		
機械Ser.No	140605T	到達圧力	21.3KPa		
製造年月		ゲージ圧表示	(-80KPa)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 弊社真空度計で-75.0KPa到達を確認 1時間運転問題なし。

真空計と接続。

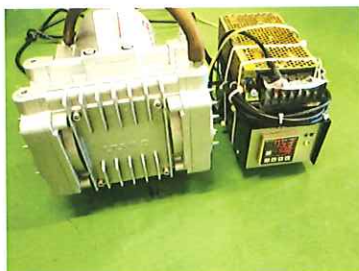

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

