


# 動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ターボポンプset	電源	AC200v 単相に設定
型式	TG220FVAB/TC223	フランジ	VG100/NW25
メーカー	大阪真空	使用時間	39852h ベアリング交換アラーム発生中
製造年	2008/9		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データーバックアップ	PLC (済 (未対象 NG) TP (済 (未対象 NG) BT (済 (未対象 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源投入してLOCALに設定してスタート、10分程度で到達圧力  $1.8 \times 10^{-3}$  Pa 確認。  
連続1h運転及び停止動作も問題なし。

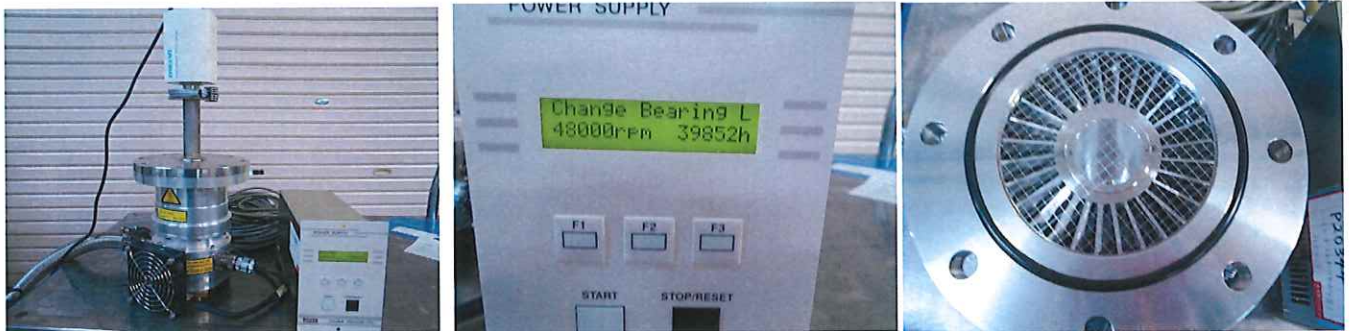

操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

