

動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チューピングポンプ	電源電圧	単相100V, 28W		
型式	FP300-1515	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アズワン	大きさ(W×D×H)	208×353×187		
機械Ser.No	21010052				
製造年月	不明				


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 呼び水、回転数調整、右回り・左回り回転の動作問題なし。
 - 標準のシリコンチューブ(#25 内径/外径:4.8/8.0mm)はないため、内径/外径:4/8mmのシリコンチューブを装着し、水道水の送液流量を確認した。
- 回転数の増加比率と流量の増加比率は一致しないが、使用上は問題ないとする。

回転数 (rpm)	回転 方向	流量 (mL/min)
100	右回り	130
	左回り	130
200	右回り	275
	左回り	275
300	右回り	395
	左回り	395

流量は100rpmが4分運転、200,300rpmが2分運転した時の送液量を測定し、単位時間当たりの流量に換算した数値

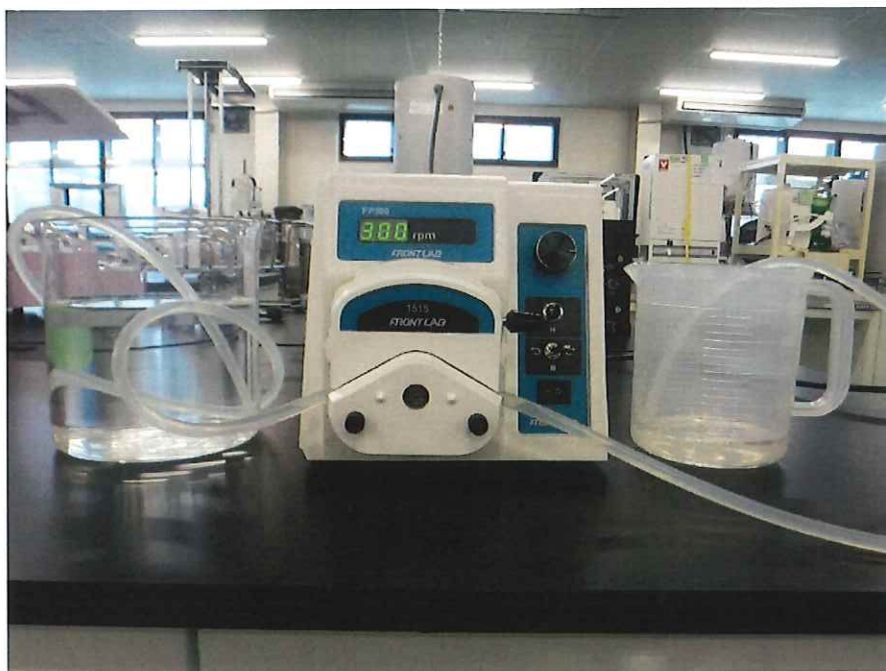

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[野沢]

長竹
