




管理番号

P30588

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相 200～220V	冷却法	空冷
型式	VD901	周波数	50・60 Hz	規格値(到達圧力)	0.67 Pa
メーカー名	アルバック	モーター電力	3.7 kw	排気速度	1500/1800 L/min
機械Ser.No	NB074B-00437	吸気口	VG50	重量	105 kg
製造年月	2014	排気口	VG50	オイルミストトラップ	TM401

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	-
6 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

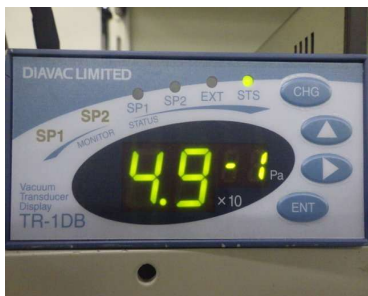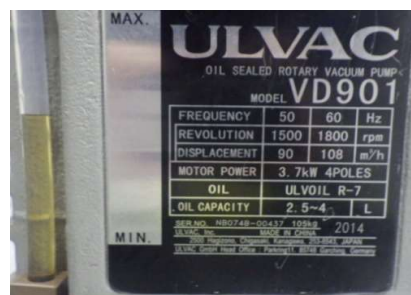

※到達圧力 : 0.49 Pa

電流値: 5.54 A

取扱説明書(無) ※暖気運転60分後、再起動時の到達圧力

到達圧力・電流値異常有りません

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

検査担当者[金子]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

