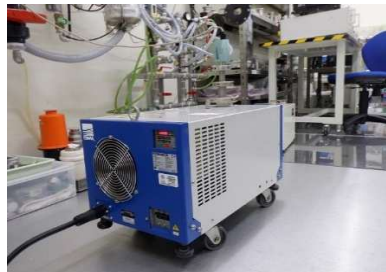


再動作確認チェックシート

検査日	2025年8月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	排気速度	1000L/min
型式	EV-A10-3	周波数	50・60 Hz	電流値	7.0A
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW40	重量	75Kg
機械Ser.No	DME00418	排気フランジ	NW40		
製造年月	2015年	到達圧力	1.0Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無い。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無い。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

到達圧力 : $7.9 \times 10^{-1} \text{Pa}$

電流値 : 5.23A

* 暖気運転60分後、再起動 ➡ 60秒経過後の到達圧力です。 到達圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無) * 起動中、異音及び振動等の異常は有りませんでした。

修理・改造履歴

年月日	作業内容	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [3.0H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

