

P70262

動作確認チェックシート

検査日	2025年8月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	単相200-230V		
型式	RKS402J-MV	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	オリオン機械				
機械Ser.No	1508008				
製造年月					


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 圧送ポンプINV寿命注意ランプ点灯(C95)、インバータ交換推奨。
- 2 タンクに水MAXで水温27℃、設定温度5℃約23分で5℃確認。
- 3 流量測定、約23L/min。

IN,OUT連結

約23L/min

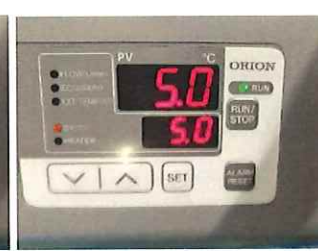

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント) インバータ交換、推奨。

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

