

動作確認チェックシート


検査日	2025年 11月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバーター	外寸	W150 D260 H140	出力	AC200~240V
型式	FR-A820-2.2K-1	電源電圧	三相200~240V		0.2~590Hz
メーカー名	三菱電機	周波数	50/60Hz		ND11.0A
機械Ser.No	Y39C3P019	出力容量	2.2kw		
年式	2023-09	重量	3.3kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。




- 1、外観確認を実施。 → 問題なし。
- 2、動作確認。 → 問題なし。
 - ①社内モーター (AC200V 50/60Hz 2.2kw) 負荷にて動作確認。安定的に動作。
 - ②周波数を可変 (60. 50. 25. 0Hz) させて回転速度を確認。0Hzで停止。
 - ③各スイッチ・表示機能動作確認OK。

動作確認

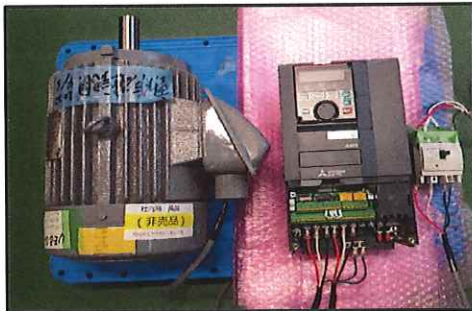

動作確認時のパラメータ設定確認(オールクリア初期化後)

Pr:0 → 4.0 設定確認 ハード的処置
 Pr:1・3・4 → 60HZ 設定確認 P1-P/+ショート線
 Pr:2 → 0 HZ 設定確認 PX-PRショート線
 Pr:7・8 → 5.0 設定確認 PC-S1とPC-S2ショート線
 Pr:9 → 11.0A 設定確認 SIC-SDショート線
 Pr:77 → 2 設定後初期化開始
 Pr:78 → 0 設定確認
 Pr:79 → 1 設定確認

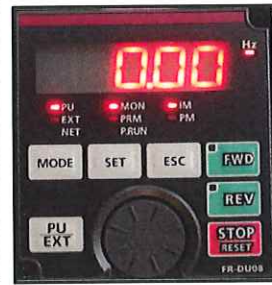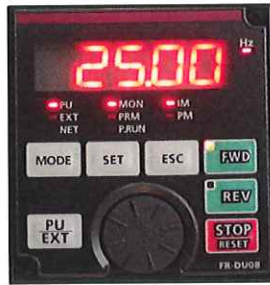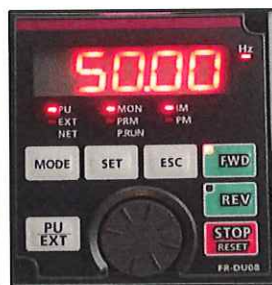

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0 H]

検査担当者[佐藤(紀)]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

