

管理番号

VDC550


# 動作確認チェックシート

検査日	2016年9月24日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	単相AC100V	
型式	DA-241-S	周波数	(50・60)Hz	
メーカー名	アルバック	排気速度	240/260L/min(50/60HZ)	
機械Ser.No	NO 0600627	到達圧力	16KPa	
製造年月		ゲージ圧表示	(-85.3)	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	○
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空度計で-81KPa到達を確認  
弊社基準値5%以内(-81KPa)

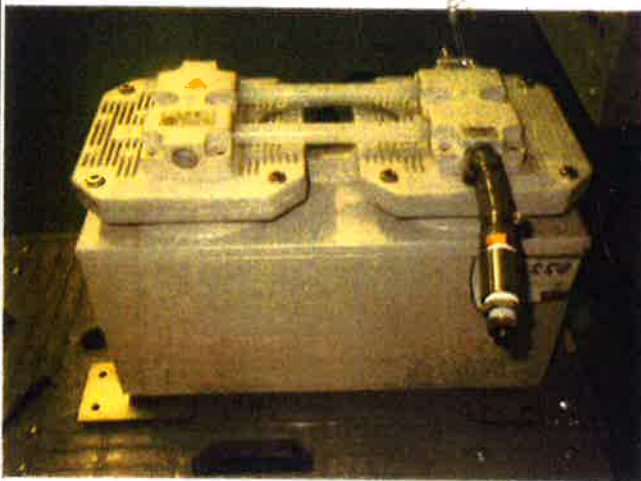

取扱説明書(有・無)  有

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2018年4月24日	再確認-DKダイヤフラム交換。	上田

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(○・NG) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日
