

管理番号

**XCCH75**

# 動作確認チェックシート

検査日	2017年 7月 13日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	電解液注入装置	電源電圧	AC100v
メーカー	MEDC	装置外寸	1090x490x810
		内寸	φ259x152 トレー 218.5x68.5


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 装置電源投入、手動及び自動動作問題なし。加圧0.4MPa及び到達圧力 7Pa確認。

2 ワーク、薬液無いのでドライ運転にて確認。

プロセスは 真空引き→接液→大気圧→加圧→大気圧→真空引き→大気圧→治具下降。

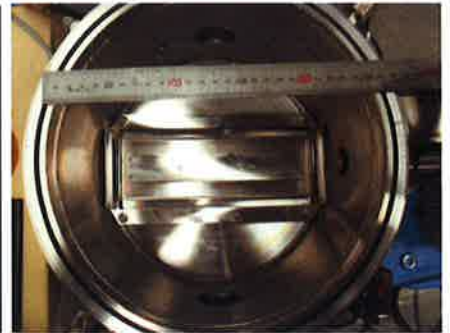

操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4H] 本装置にはポンプは付属しない。

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

