

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 7月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ディスペンサー	電源電圧	単相 100V	製造年月	不明
型式	ME-303VT	周波数	50・60Hz兼用	吐出圧力設定範囲	0.05~0.7MPa
メーカー名	武蔵縁エンジニアリング	機械Ser.No	3V010000025	吐出時間設定	最大9.99sec
外形寸法	W223×D245×H170	質量	約4.3kg	エア-IN	0.7MPa以下

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認を実施。→動作OK。(但し、入力信号用コネクタ付属無し。)
- 2、通電時の各設定部動作確認を実施。→動作OK。


☆ 送液圧力制御(PRESS/ADJ)動作、バルブ制御(PRESS/ADJ、TIME/OFF/MAN、INTERVAL/SHOT)動作

- 3、テスト用シリンジ(液は水)にて動作確認及び塗布量を目視確認実施。→問題無し。バルブ制御2ポートは双方逆動作。

(吐出圧力と時間を、テスト用シリンジからの水にて塗布量を目視動作観察実施。)

(タイマー動作確認実施。又外部入力:フットスイッチで確認。)

## ディスペンサーの動作確認

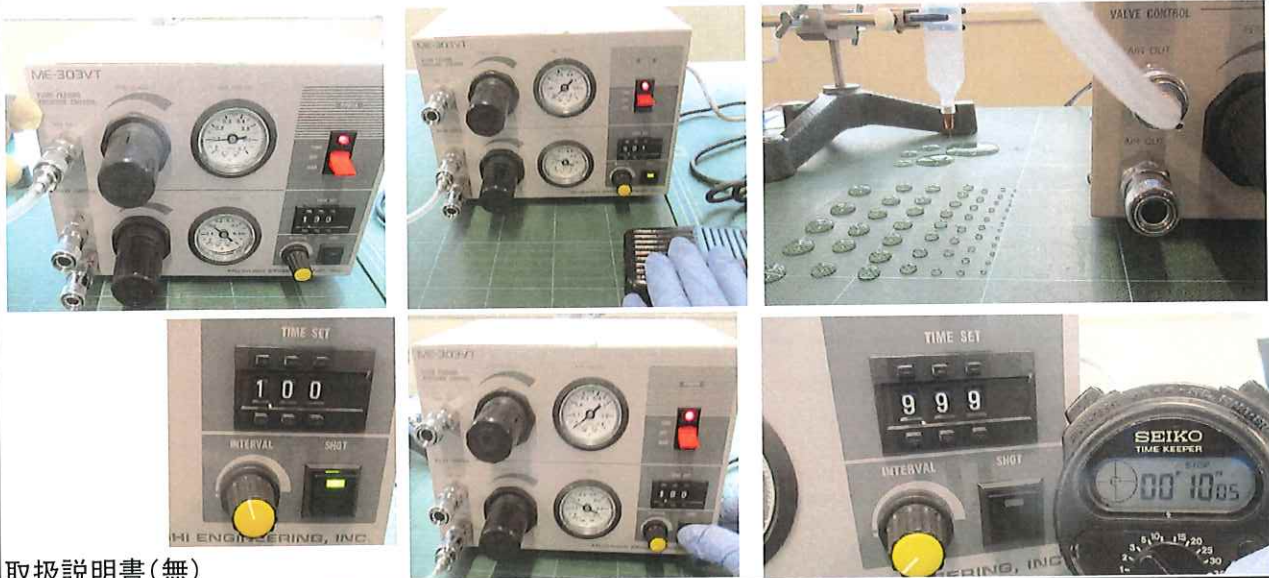

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力  
 動作(OK) 作業工数[ 3.5H ]  
 検査担当者[ 小林(克) ]  
 ユーザー名[

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

