

動作確認チェックシート

検査日	2024年 8月 20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアシャワー	電源電圧 (V)	3相 AC200	蛍光灯	LED20形 2灯
型式	NAS-T322PSL2-E	周波数 (Hz)	50/60	ファン	4台(0.72kW)
メーカー名	ニッター冷熱	外寸 (mm)	W1200 D2000 H2000	床	無し
機械Ser.No	不明	内寸 (mm)	W800 D1800 H1850	重量(kg)	480
製造年月	2020年	吹出し口	32ヶ所		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

- ◎動作確認 ○ダーティ側扉から入り、扉を閉めてエアが吹出すことを確認 OK
- ダーティ側扉から入り、扉を閉めてタイマーのカウントダウンが開始することを確認 OK
- タイマーのカウントダウン中にダーティ側またはクリーン側の扉が開かない事(インターロック機能)を確認 OK
- タッチパネルにて照明の[ON] [OFF] [AUTO]の切替に応じてランプが点灯・消灯することを確認 OK
- パーティクル測定確認 OK


※ログイン出来ない



パーティクル確認



0.3µm以上が 0/CF

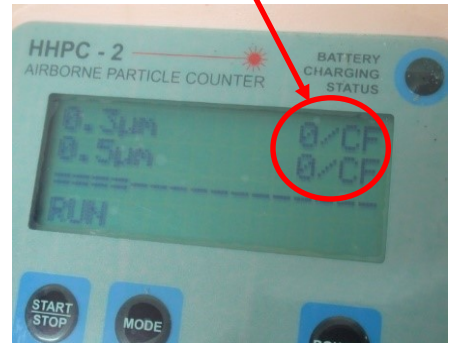

※ログインIDとパスワードが不明な為、ログイン出来ず、各種設定はできません。

但し、エアシャワー機能としては問題ないと判断しました。

設定条件：タイマー：30sec、マニュアル操作NGとなります。

メーカーに確認後、再度確認を行う。

取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024.8.21	メーカー確認: ログインID:USER1 パスワード:1111	中野

Shirasagi入力 動作(OK) 作業工数[2.0 H] 検査担当者 [小俣] ユーザー名【	(備考欄コメント) 】出荷日 年 月 日	[責任者]
---	-------------------------	-------

別紙1：O50945（エアシャワー）各種設定画面表示

2024.08.22

