管理番号

FF3AB1

動作確認チェックシート

検査日	2016年7月20日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	精密空調ユニット	電源電圧	3 相 200 V 9．8/10.2KW(最大入力)	弊社50HZで確認	
型式	PAU-W3430-1HC	周波数	（50 ・ 60）Hz	温度設定範囲	20～26℃
メーカー名	アピステ	冷媒	R-407C	湿度設定範囲	55～70%
機械Ser,No	K05-20041S	冷却能力	2800W	設定可能周囲温度	20～30℃
製造年月	2006	加湿能力	5．2Kg/h	設定可能周囲湿度	30～70%

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	絶縁抵抗	ライン、匡体間 （テスタで確認。・・・メガΩテスタ使用の場合は部品破損注意）	○
5	消費電流	クランプで実測。（3．9A）	○
6	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 SW類 ブレーカー RUN ERROR 正常作動

2 表示類 サーモメーター湿度計 入力設定 正常作動

3 動作

室温28℃湿度60%

温度計25℃湿度55%設定 オートチューン実行

30分以内で設定値のほぼ誤差以内

温度設定20℃湿度30%で1時間後温度20℃湿度47%到達

測定箱1480×985×380使用

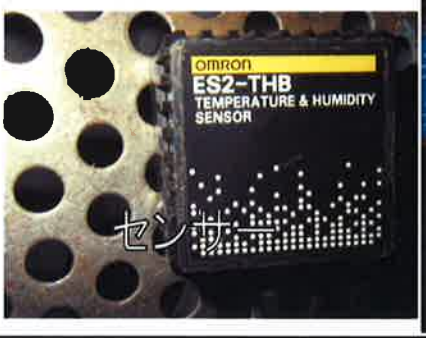

取扱説明書（有・無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2016年7月20日	温湿度センサー オムロンES2—THB交換	上田

File Maker入力

動作（OK・NG） 作業工数[27 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

（備考欄コメント）

[責任者]
